

GREEN COMMUNITIES

PNRR MISURA M2, COMPONENTE C1,
Investimento 3.2 (M2C1 Inv. 3.2)

INCONTRO CON I SOGGETTI
ATTUATORI 12 APRILE 2023

Dr.ssa Roberta Piano



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
NUCLEO PNRR STATO-REGIONI





CRONOPROGRAMMA DI MISURA

Tabella di marcia

- ❖ L'Amministrazione titolare definisce, aggiorna e verifica la programmazione attuativa attraverso la gestione del cronoprogramma procedurale della misura
- ❖ Si tratta di una programmazione di dettaglio del processo di attuazione delle misure di propria competenza

FINALITA'

- ❖ Assicurare la effettiva realizzabilità delle M&T entro le scadenze concordate a livello europeo
- ❖ Consentire il monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell'attuazione
- ❖ Individuare tempestivamente possibili scostamenti e adottare eventuali azioni correttive

CRONOPROGRAMMA DI MISURA

COSTRUZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

- ❖ Definire i processi e le attività da realizzare
- ❖ Assicurarsi tempi di attuazione compatibili con le scadenze delle milestone e dei target

ATTUAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

- ❖ Verificare l'andamento delle fasi procedurali e delle tempistiche ad esse associate
- ❖ Prevedere con anticipo eventuali scostamenti e individuare soluzioni attuative che evitino il loro impatto sul conseguimento delle milestone e dei target associati alla misura



CRONOPROGRAMMA DI MISURA

CONTENUTO DEL CRONOPROGRAMMA

- ❖ milestone e target a rilevanza europea
- ❖ milestone e target a rilevanza italiana
- ❖ monitoring step (interim ed ex-post)
- ❖ ulteriori step procedurali per garantire un numero adeguato di **punti di controllo**

Milestone: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities

Target: completamento di almeno il 90 % degli interventi previsti per le Green Communities

Scadenza: 30/06/2026

Completata!



CRONOPROGRAMMA DI MISURA

MACRO-FASI DEL CRONOPROGRAMMA

Attivazione della misura

Attivazione degli interventi

Esecuzione degli interventi

Monitoraggio degli interventi

Noi
siamo
qui



CRONOPROGRAMMA DI MISURA

Fasi estratte relative all'attivazione e all'esecuzione degli interventi

Descrizione fase	Tipologia fase	Data di completamento prevista	Stato	Data di completamento effettiva	Output
0.18 Attivazione degli interventi - Approvazione della progettazione esecutiva	step procedurale	15/03/2025	da avviare		Lista dei Progetti che hanno approvato la progettazione esecutiva - da Regis
0.19 Attivazione degli interventi - Aggiudicazione dei lavori da parte dei Soggetti Attuatori	step procedurale	31/03/2025	da avviare		Rapporto contenente i riferimenti ufficiali dell'aggiudicazione degli appalti da parte delle Green Communities
0.20 Attivazione degli interventi - Stipula dei contratti	step procedurale	31/05/2025	da avviare		Lista dei contratti stipulati tra i Soggetti Attuatori e le imprese aggiudicatrici dei lavori - da Regis
0.21 Esecuzione degli interventi - Avvio dei lavori	Avanzamento lavori del progetto	31/03/2025	da avviare		Report Elaborazione dati da REGIS
0.22 Esecuzione degli interventi - Presentazione I SAL	Avanzamento lavori del progetto	30/06/2025	da avviare		Report Elaborazione dati da REGIS
0.23 Esecuzione degli interventi - Presentazione II SAL	Avanzamento lavori del progetto	30/09/2025	da avviare		Report Elaborazione dati da REGIS
0.24 Esecuzione degli interventi - Presentazione III SAL	Avanzamento lavori del progetto	31/12/2025	da avviare		Report Elaborazione dati da REGIS
0.25 Esecuzione degli interventi - Fine lavori	Concorre al Target UE M2C1-21	31/03/2026	da avviare		Certificati di collaudo

❖ Decreto d'impegno e flusso finanziario



La procedura di pagamento al Soggetto Attuatore prevede le seguenti fasi:

Fasi

I) Anticipazione: non superiore al 10% del totale del finanziamento



II) SAL: quattro quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento



III) Saldo: quota finale del 10 % fino al raggiungimento del 100% del totale del finanziamento



Requisiti

Dichiarazione di avvio attività e contestuale domanda di pagamento e conferma dati bancari

Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute pari al raggiungimento del 25/50/75/90% del totale del finanziamento

Rendicontazione di spesa per il 100% del Piano finanziato, corredata della documentazione attestante l'effettiva conclusione nonché il raggiungimento del target previsto

❖ Decreto d'impegno e flusso finanziario



Aggiornamento pagamenti I quota – Anticipazione 10 %

2 marzo 2023

Decreto di approvazione delle convenzioni sottoscritte dal DARA per la realizzazione di 36 piani di sviluppo di Green Communities

14 marzo 2023

Registrazione presso la Corte dei Conti al n. 771 del 2023

15 marzo 2023

Richiesta di erogazione dei fondi dal conto di Tesoreria Centrale dello Stato al conto di contabilità speciale del DARA

31 marzo 2023

Disponibilità delle risorse sul conto di contabilità speciale e inizio delle verifiche e dei pagamenti ai Soggetti attuatori

❖ Decreto d'impegno e flusso finanziario

Aggiornamento pagamenti I quota – Anticipazione 10 %

La situazione dei pagamenti della quota di anticipo del 10%, alla data del 12 aprile 2023, è la seguente:



Disposizioni di pagamento inserite ed approvate => 22 GC;



Disposizioni di pagamento in sospeso:

- ❖ in attesa di conferma IBAN => 2 GC (conto di tesoreria in ReGiS diverso da quanto comunicato nel format Avvio attività);
- ❖ In attesa di inserimento nell'anagrafica beneficiari => 7 GC;




Dichiarazione Avvio attività e domanda di pagamento non ancora pervenuta => 5 GC

❖ Fondo Opere Indifferibili

FOI FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI 2023

Art. 1, commi da 369 a 379 Legge 29 dicembre 2022 n.197:
disciplina accesso al FOI per le procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1 gennaio 2023
al 31 dicembre 2023

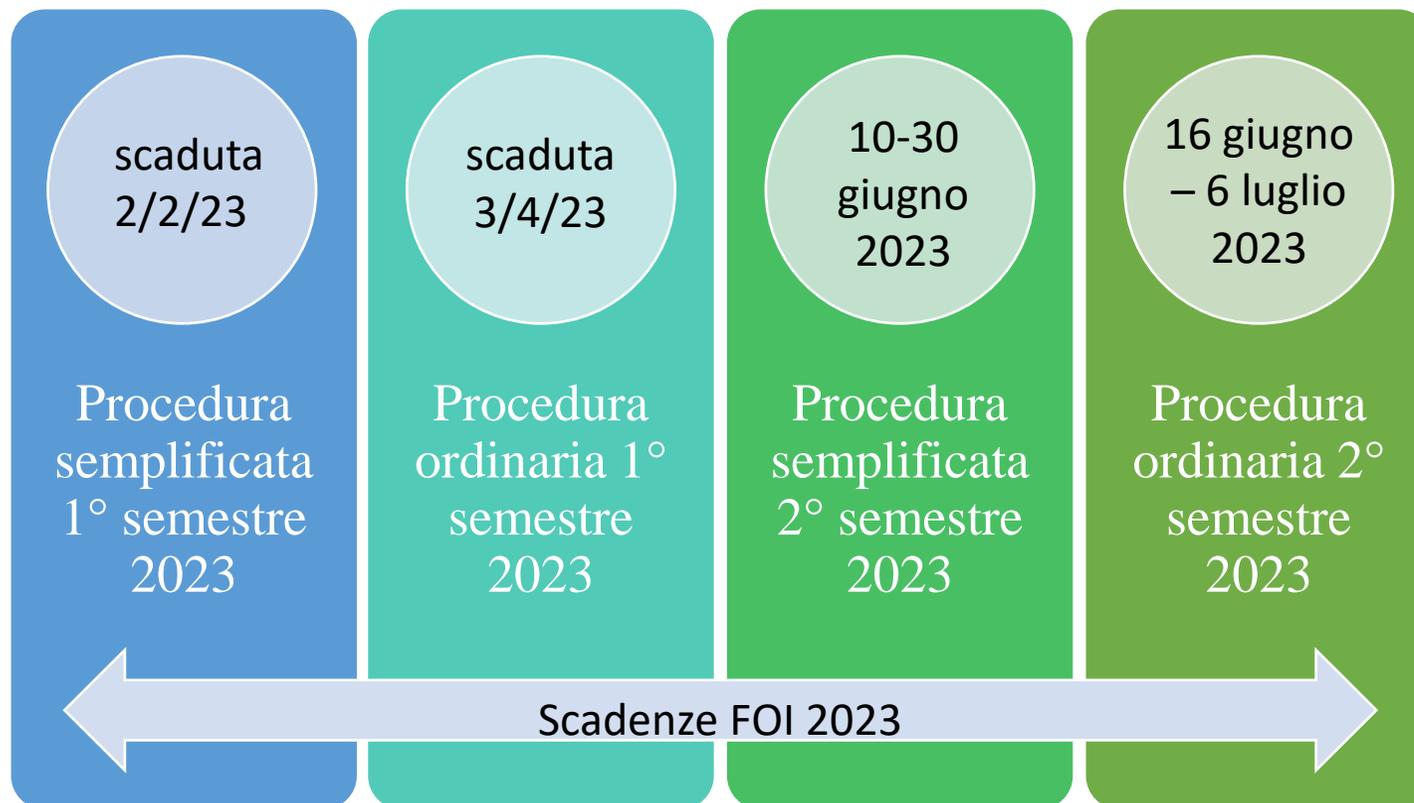


❖ Requisiti per l'accesso al Fondo Opere Indifferibili


Requisiti



Pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero invio delle lettere finalizzate all'affidamento per opere pubbliche e interventi, **dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023** e dal **1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023**, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale;



Fabbisogno finanziario derivante esclusivamente dall'aggiornamento dei prezziari di riferimento aggiornati in relazione all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici relativi ai soli appalti di lavori;



Solo CUP lavori

❖ Procedura semplificata – primo semestre

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2023 - GU Serie Generale n.75 del 29-03-2023

PREASSEGNAZIONI PNRR ALLEGATO 1	Totale
Ministero della Cultura	34.307.796,49 €
Ministero dell'Interno	340.308.054,14 €
Ministero dell'Istruzione e Merito	291.667.842,07 €
Ministero Infrastrutture e Trasporti	66.209.331,68 €
PCM - Dip. Affari Regionali e Autonomie	1.140.244,77 €
PCM - Dip. Politiche di Coesione	32.009.449,19 €
PCM - Dip Protezione Civile	12.992.276,09 €
PCM - Dipartimento per lo Sport	22.257.544,34 €
Totale Contributi Concessi	800.892.538,77 €

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera (6 CUP)
- GC Alta Valle Arroscia (6 CUP)
- Comune di Rocca Sinibalda: (5 CUP)
- Unione dei Comuni Alta Gallura (14 CUP)
- Unione Montana Valle Varaita (1 CUP)

Con Decreto del Ragioniere generale dello Stato è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione.



❖ Procedura semplificata e ordinaria FOI – primo semestre 2023



Procedura semplificata FOI primo semestre 2023

scaduta 2/2/23

Comma **370** art. 1 Legge 29 dicembre 2022 n.197


Modalità di verifica e revoca pre-assegnazione (**art. 10 D.M. 10/02/23**)

Economie e recupero delle somme assegnate (**art. 11 D.M. 10/02/23**)

Controlli MEF-RGS (**art. 13 D.M. 10/02/23**)

Presentazione tramite piattaforma ReGiS

Avvio procedure di affidamento **entro 30/6/23**



Procedura ordinaria FOI – primo semestre 2023

scaduta 3/4/23

Contenuti domanda (**art. 6 D.M. 10/02/23**)

Verifica istruttoria (**art. 7 D.M. 10/02/23**)

Verifica istanze, procedura assegnazione risorse (**art. 9 D.M. 10/02/23**)

Economie e recupero delle somme assegnate (**art. 11 D.M. 10/02/23**)

Controlli MEF-RGS (**art. 13 D.M. 10/02/23**)

Presentazione tramite piattaforma ReGiS

Avvio procedure di affidamento **entro 30/6/23**

se 10% non
sufficiente

Per quesiti di natura **amministrativa contabile**, il Soggetto Attuatore deve mandare il quesito alla casella postale istituzionale del **Fondo: fondo.opereindifferibili@mef.gov.it** (con in cc **affariregionali.nucleopnrr@governo.it**).

Per quesiti di natura informatica, il Soggetto Attuatore può rivolgersi all'assistenza aprendo un ticket sulla piattaforma ReGiS.





❖ Iter FOI Procedura semplificata

I **Soggetti Attuatori** che hanno confermato, entro il **30 gennaio** per il primo semestre ed entro il **30 giugno** per il secondo semestre, la preassegnazione e che sono stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato devono, entro **dieci giorni** dall'avvio della procedura di affidamento provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare ReGIS (cfr. art. 10 D.M. 10/02/23)

Il **Nucleo PNRR**, entro 5 giorni, procede alla validazione delle info trasmesse

Entro 10 giorni chiusura semestre con decreto **RGS** assegnazione **definitiva** preassegnazioni

Entro **20 luglio 2023** e **20 gennaio 2024** RGS riscontra avvenuto avvio procedura di affidamento


In caso di conferma accettazione della preassegnazione, ma **mancato riscontro** pubblicazione procedure di gara, accesso consentito **solo** alla procedura **ordinaria** del **secondo** semestre

Gare andate deserte (art. 10 D.M. 10/02/2023)





❖ Iter FOI Procedura ordinaria

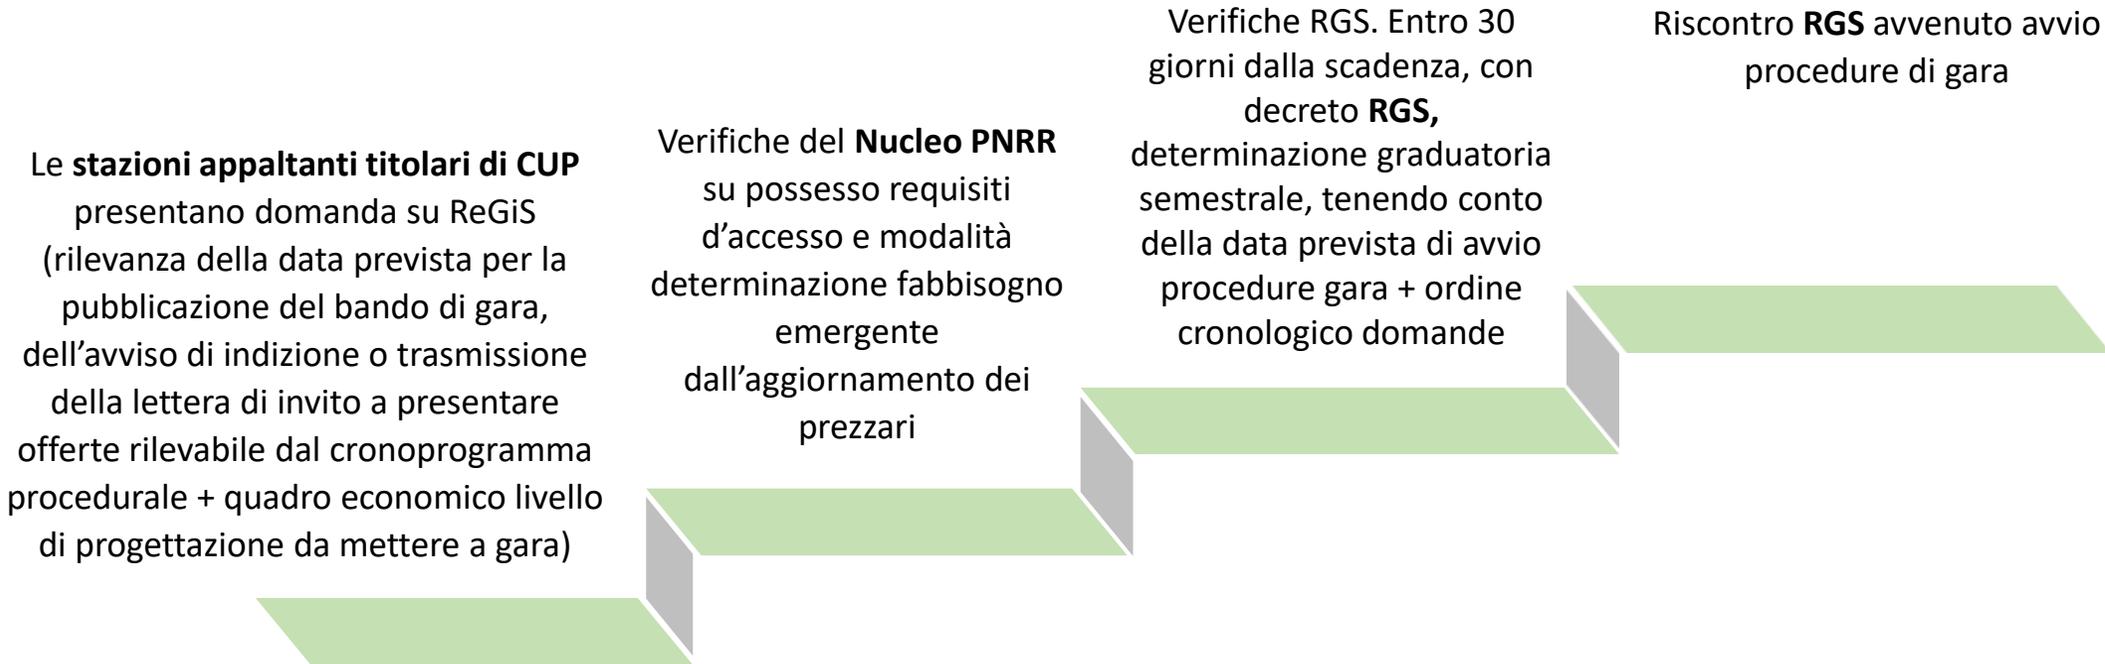

Decreto di assegnazione è trasmesso al Nucleo PNRR che comunica alle stazioni appaltanti la disponibilità delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere e per l'accertamento delle risorse a bilancio.

Gare andate deserte (art. 9 D.M. 10/02/2023)

